御前崎港における防波堤（東）消波工事のお知らせ

発注者：国土交通省　中部地方整備局　清水港湾事務所　御前崎港事務所　TEL 0548-63-4840
http://www.shimizu.pa.cbr.mlit.go.jp/

施工者：㈱古川組静岡支店　御前崎営業所　TEL 0548-63-2394
http ： //www.furkawa.co.jp
現場代理人：山口康二　TEL 080-3593-1547（携帯）
監理技術者：渡邊靖健　TEL 080-3593-1910（携帯）

御前崎港防波堤（東）の消波工事が下記の通り行われますので、付近を航行する船舶は十分な注意と、本工事の安全確保に御協力を御願い致します。

記

１．工事期間　：平成28年9月12日～平成29年3月21日迄の間（約6ヶ月）
２．工事時間　：日の出　～　日没
３．工事区域　：下記に示す区域（海域）　御前崎港防波堤（東）
４．工事内容　：作業船（起重機船及び潜水士船）による上部工，消波ブロック運搬据付，灯台据付工事が実施されます。
５．標　　識　：工事作業船には海上衝突防止法第27条の規定による標識を掲げます。

参考写真：上部コンクリート打設状況

参考写真：消波ブロック据付状況

参考写真：灯台据付状況

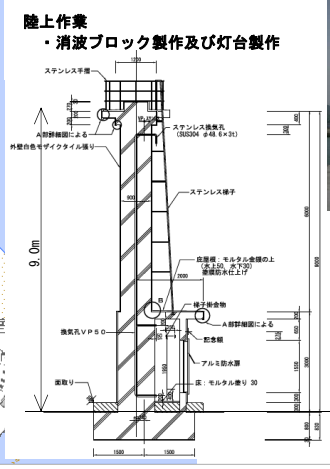



計画工程表
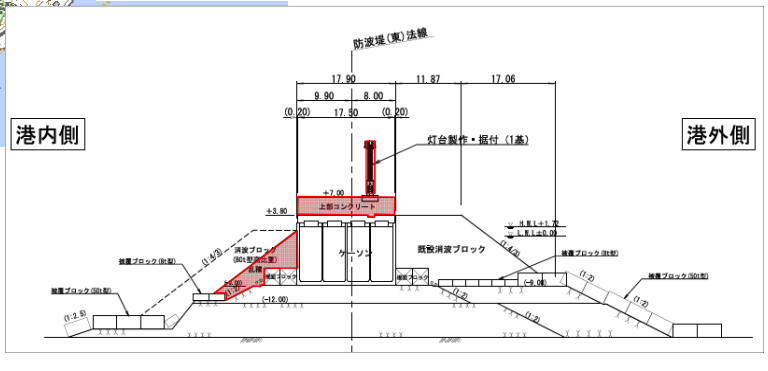
工種別	規格・形状寸法	数量	平成28年 8月	9月	10月	11月	12月	平成29年 1月	2月	3月	摘要
準備工		1式									
上部工 上部コンクリート	18-8-40BB 65%以下 L=15.8m, ポンプ打設	15.8m									721m3
伸縮目地		1箇所									23m2
消波工 消波ブロック製作	21-8-40BB 65%以下 80t型高比重（2.6以上）	62個									2,170m3
消波ブロック運搬・据付	80t型高比重（2.6以上）	62個									（49個転置）
灯台製作・据付工 灯台製作	24-18-25BB 65%以下 H=9.9m, W=40.0t	1基									16m3 鉄筋 1,814kg
灯台据付		1基									
標識灯移設工 標識灯移設	既設標識灯 H=1.415m, W=4.8t	1基									アンカーボルト 20本
片付工		1式									
計画	月別出来高（%）		2	3	20	35	30	2	6	2	
	累計出来高（%）		2	5	25	60	90	92	98	100
